工程概要-整體工程預定進度表S-Curve

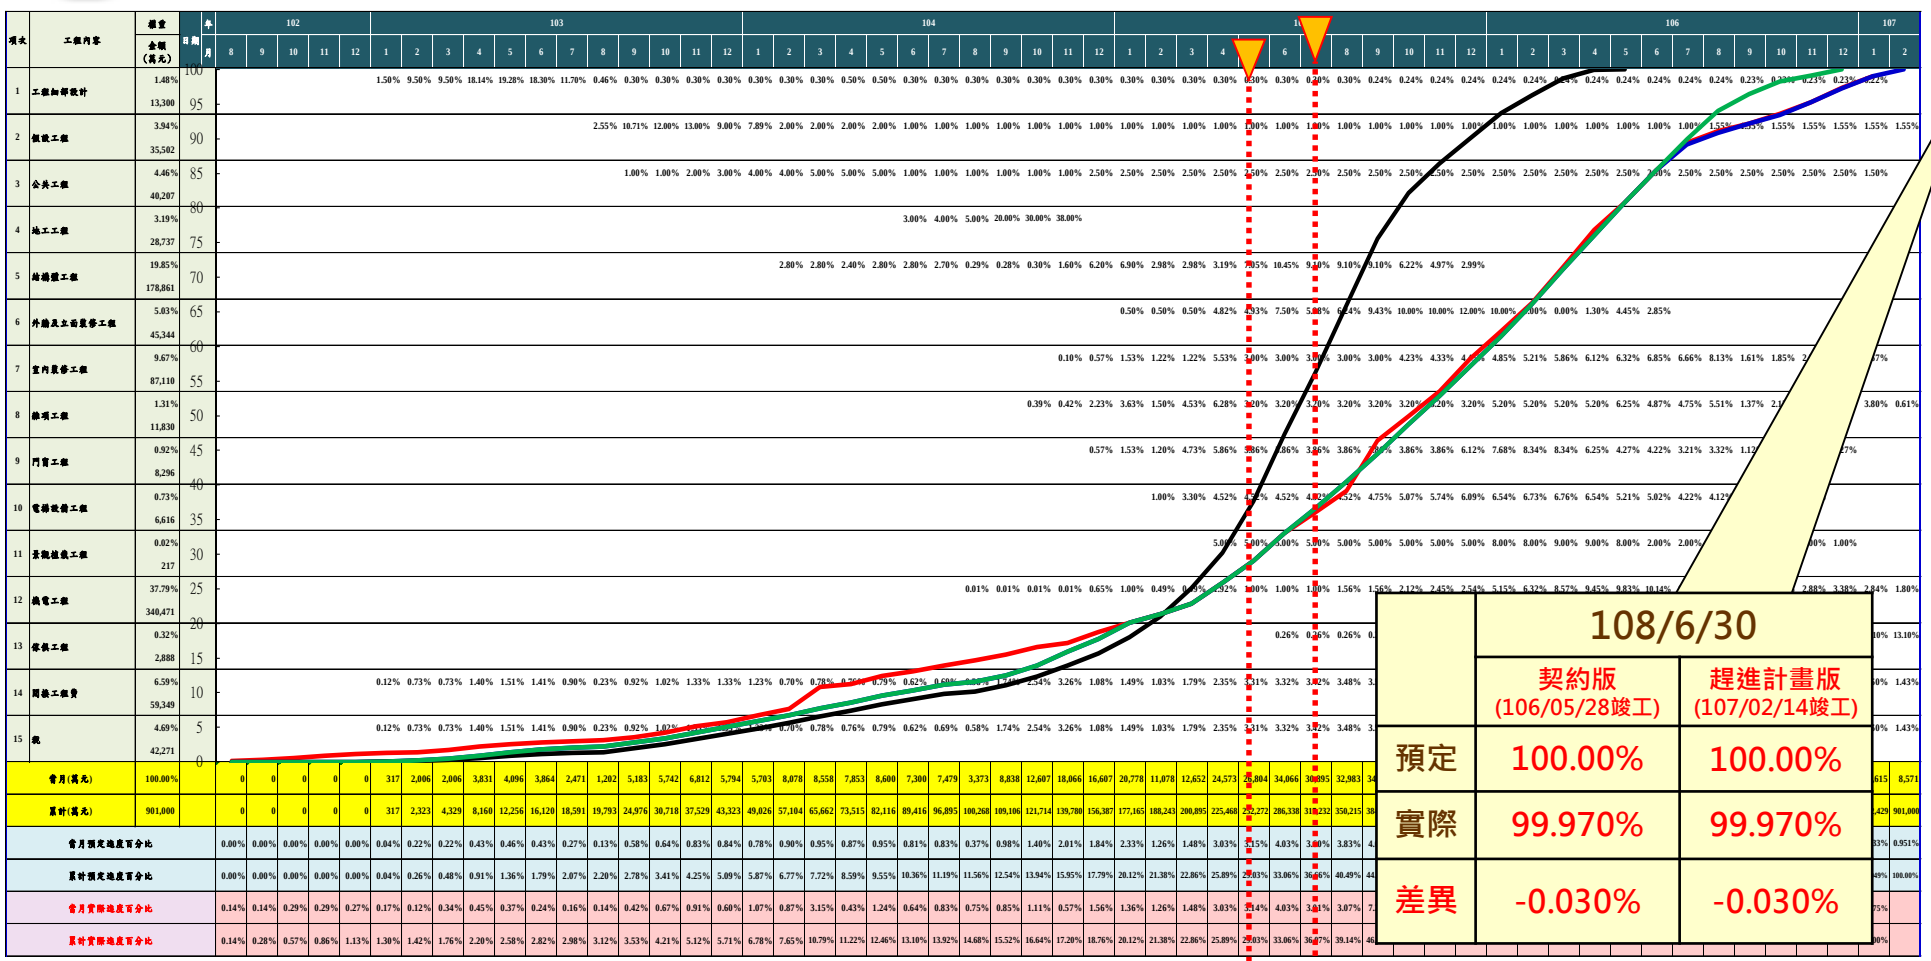

	108/6/30	
	契約版 (106/05/28竣工)	趕進計畫版 (107/02/14竣工)
預定	100.00%	100.00%
實際	99.970%	99.970%
差異	-0.030%	-0.030%

原核定進度

第5次修正進度(第4次展延)

趕進計畫進度(遲延履約272天)

實際進度

Ⅰ、依契約進度落後5%:105/5/12

Ⅱ、依契約進度落後10%:105/6/10

Ⅲ、108/6/30進度
